
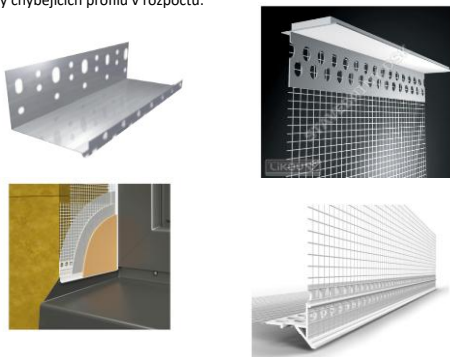


Dotazy MŠ SRDÍČKO, PRAHA 12

číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci	Dotaz																																																																																														
1.	Všechny části	Všechny položky	Prosíme o doplnění výpočtů výměr - tj.výkazů výměr do položkového rozpočtu, aby bylo možné zkontrolovat množství výměr. Bez výkazů výměr není možná kontrola výměr v rozpočtu.	Prosíme o doplnění výpočtů výměr - tj.výkazů výměr do položkového rozpočtu, aby bylo možné zkontrolovat množství výměr. Bez výkazů výměr není možná kontrola výměr v rozpočtu.																																																																																														
2.	Fasáda	25	Zde je položka z rozpočtu a pod ní je rozbor položk z ÚRSu, z programu Kros - je vidět, že v rozpočtu chybí penetrace podkladu. <table><tr><td>25</td><td>K</td><td>621221111</td><td>Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm</td><td>m2</td><td>49,120</td></tr><tr><td>TC</td><td>Kód</td><td>Popis</td><td>MJ</td><td>Množství</td><td></td></tr><tr><td>pc</td><td>08211321</td><td>voda pitná pro ostatní odběratele</td><td>m3</td><td>0,00500</td><td></td></tr><tr><td>pc</td><td>41119446</td><td>vrták do betonu 8x150/200mm</td><td>kus</td><td>0,03400</td><td></td></tr><tr><td>pc</td><td>58562011</td><td>směs suchá lepicí a stěrková cementová</td><td>kg</td><td>12,00000</td><td></td></tr><tr><td>pc</td><td>59051210</td><td>hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x135mm</td><td>kus</td><td>10,00000</td><td></td></tr><tr><td>pc</td><td>59051382</td><td>talířek hmoždinkový přídavný pro kotvení tepelně izolačních minerálních vln s kolmým vláknem</td><td>kus</td><td>10,00000</td><td></td></tr><tr><td>pc</td><td>63127001</td><td>tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 165g/m2</td><td>m2</td><td>1,20000</td><td></td></tr><tr><td>s1</td><td>712000-S3-T1</td><td>Dělník</td><td>Nh</td><td>0,52000</td><td></td></tr><tr><td>s1</td><td>712000-S3-T3</td><td>Dělník</td><td>Nh</td><td>0,86000</td><td></td></tr><tr><td>s1</td><td>401010023500</td><td>Míchačka aktivací objem 0,35 m3</td><td>Sh</td><td>0,01100</td><td></td></tr></table>	25	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	49,120	TC	Kód	Popis	MJ	Množství		pc	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,00500		pc	41119446	vrták do betonu 8x150/200mm	kus	0,03400		pc	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	12,00000		pc	59051210	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x135mm	kus	10,00000		pc	59051382	talířek hmoždinkový přídavný pro kotvení tepelně izolačních minerálních vln s kolmým vláknem	kus	10,00000		pc	63127001	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 165g/m2	m2	1,20000		s1	712000-S3-T1	Dělník	Nh	0,52000		s1	712000-S3-T3	Dělník	Nh	0,86000		s1	401010023500	Míchačka aktivací objem 0,35 m3	Sh	0,01100		V rozpočtu chybí penetrace podkladu před provedením zateplovacího systému. Prosíme o doplnění položek pentetrace podkladu - kódy v ÚRS jsou: <table><tr><td>Ceník</td><td>Část</td><td>Kód položky</td><td>Popis</td><td>MJ</td><td>Výrobce</td><td>Orientační cena</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>nanášená ručně</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>621131121</td><td>podhledů</td><td>m2</td><td></td><td>71,80</td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>622131121</td><td>stěn</td><td>m2</td><td></td><td>60,80</td></tr></table>	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena				nanášená ručně				011	A04	621131121	podhledů	m2		71,80	011	A04	622131121	stěn	m2		60,80
25	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	49,120																																																																																													
TC	Kód	Popis	MJ	Množství																																																																																														
pc	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,00500																																																																																														
pc	41119446	vrták do betonu 8x150/200mm	kus	0,03400																																																																																														
pc	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	12,00000																																																																																														
pc	59051210	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x135mm	kus	10,00000																																																																																														
pc	59051382	talířek hmoždinkový přídavný pro kotvení tepelně izolačních minerálních vln s kolmým vláknem	kus	10,00000																																																																																														
pc	63127001	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 165g/m2	m2	1,20000																																																																																														
s1	712000-S3-T1	Dělník	Nh	0,52000																																																																																														
s1	712000-S3-T3	Dělník	Nh	0,86000																																																																																														
s1	401010023500	Míchačka aktivací objem 0,35 m3	Sh	0,01100																																																																																														
Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena																																																																																												
			nanášená ručně																																																																																															
011	A04	621131121	podhledů	m2		71,80																																																																																												
011	A04	622131121	stěn	m2		60,80																																																																																												
3.	Fasáda			V rozpočtu chybí zátky ke hmoždinkám zateplovacího systému, prosíme o doplnění položek k zátkám do rozpočtu.Lze použít tyto položky z ÚRS: <table><tr><td></td><td></td><td>62</td><td>Úprava povrchů vnějších</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>62-2-1-...</td><td>Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Příplatek k cenám</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátěk</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>na vnější podhledy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>621251101</td><td>z polystyrenu</td><td>m2</td><td></td><td>69,60</td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>621251105</td><td>z minerální vlny</td><td>m2</td><td></td><td>88,30</td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>621251107</td><td>z fenolické pěny</td><td>m2</td><td></td><td>121,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>na vnější stěny</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>622251101</td><td>z polystyrenu</td><td>m2</td><td></td><td>54,80</td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>622251105</td><td>z minerální vlny</td><td>m2</td><td></td><td>69,80</td></tr><tr><td>011</td><td>A04</td><td>622251107</td><td>z fenolické pěny</td><td>m2</td><td></td><td>95,70</td></tr></table>			62	Úprava povrchů vnějších						62-2-1-...	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením							Příplatek k cenám							za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátěk							na vnější podhledy				011	A04	621251101	z polystyrenu	m2		69,60	011	A04	621251105	z minerální vlny	m2		88,30	011	A04	621251107	z fenolické pěny	m2		121,00				na vnější stěny				011	A04	622251101	z polystyrenu	m2		54,80	011	A04	622251105	z minerální vlny	m2		69,80	011	A04	622251107	z fenolické pěny	m2		95,70										
		62	Úprava povrchů vnějších																																																																																															
		62-2-1-...	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením																																																																																															
			Příplatek k cenám																																																																																															
			za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátěk																																																																																															
			na vnější podhledy																																																																																															
011	A04	621251101	z polystyrenu	m2		69,60																																																																																												
011	A04	621251105	z minerální vlny	m2		88,30																																																																																												
011	A04	621251107	z fenolické pěny	m2		121,00																																																																																												
			na vnější stěny																																																																																															
011	A04	622251101	z polystyrenu	m2		54,80																																																																																												
011	A04	622251105	z minerální vlny	m2		69,80																																																																																												
011	A04	622251107	z fenolické pěny	m2		95,70																																																																																												
4.	Fasáda			V projektové dokumentaci ani v rozpočtu nejsou specifikované součinitele prostupu tepla tepelných izolací. Prosím e o doplnění.Pokud nebude doplněno v průběhu výběrového řízení doplněnp, tak se zadavatel vystavuje riziku víceprací v průběhu realizace.																																																																																														
5.	Fasáda			Prosíme o doplnění profilů a lišt k zateplovacímu systému, zejména se jedná o tyto profily a lišty: zakladací hliníkový profil + nasazovací okapnice k soklovému profilu, podparapetní profil pod oplechování parapetu, profil pro napojení oplechování parapetu - profil typu LX-H, profil s okapnicí pro nadpraží, dilatační profil																																																																																														


Dotazy MŠ SRDÍČKO, PRAHA 12

číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci	Dotaz						
6.	Fasáda			Obrázky chybějících profilů v rozpočtu: 						
7.	Fasáda			V rozpočtu chybí profily pro připojení na oplechování - z vrchu na oplechování stříšek a oplechování říms (horní obrázky) a ze spodu pod oplechování atiky 						
8.	Fasáda			Prosíme o prověření zdali v rozpočtu nechybí stěrkovací tmel vyztužená sklotextilní síťovinou na boky zateplovacího systému u oken a dveří a pod klempířskými prvky.						
9.	Fasáda			Prosíme o prověření, zdali v rozpočtu nechybí tenkovrstvá omítka zateplovacího systému na boky zateplovacího systému u oken a dveří.						
10.	Fasáda	40	<table><tr><td>40</td><td>K</td><td>622541012</td><td>Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn, včetně penetrace</td><td>m2</td><td>1 357,028</td></tr></table>	40	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn, včetně penetrace	m2	1 357,028	V rozpočtu je silikonsilikátová omítka, ale ta je náchylná na provádění. Je tím myšlena samočisticí omítka s fotokatyckým efektem, anebo je požadavek na obyčejnou silikonsilikátovou omítku, nebo silikonovou omítku?
40	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn, včetně penetrace	m2	1 357,028					

Dotazy MŠ SRDÍČKO, PRAHA 12

číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci						Dotaz
11.	Fasáda	57	57	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 776,640	V rozpočtu je uvedeno trubkové lešení, toto lešení se dnes prakticky nepoužívá. Zhotovitel bude realizovat jiná typ lešení - lešení rámové, za ceny uvedené v rozpočtu.
12.	Fasáda	63	63	K	V03	Repase veškerého mobiliáře, odstranění a opětovné vrácení na původní místo. (květinové nádoby, zábradlí, zídka, apod.)	kus	1,000	Prosí o přesnou specifikaci a kvantifikaci toho, co je předmětem položky „Repase veškerého mobiliáře, odstranění a opětovné vrácení na půvdní místo).
13.	Fasáda	64	64	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	190,100	Čeho se týká položka č.64 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm ?
14.	Fasáda	66	66	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáčů	m2	1 498,664	Proč je v rozpočtu položka č.66 Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáčů. Podle nás je tato položka zbytečná a nemá žádný smysl.Při realizaci bude odečteno jako méněpráce.
15.	Fasáda	67	67	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	1 498,664	Proč je v rozpočtu položka č.67 Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm? Jedná se o plošku, která je určena pro reprofilaci betonových ploch, které jsou zkarbonované.Nikde se při revitalizaci panelových domů nereperofiluje pošně celá fasáda reprofilační hmotou, protože by to byly náklady v řádu statisíců.V případě tohoto projektu je ceníková cena ÚRS 581481 ,-Kč bez DPH. Navrhujeme, ať zadavatel změní položku na položku vyrovnaní stěn lepícím fasádním tmelem tloušťky 2 mm.
16.	Fasáda	72	72	K	V04	oprava izolace proti zemní vlhkosti, - komplet	ks	1,000	Prosíme o přesný popis položky č.72 oprava izolace proti zemní vlhkosti, - komplet s uvedením přesné výměry
17.	Fasáda	99	99	K	V05	repase zábradlí na lodžii včetně zasklení bezpečnostním sklem conex (demontáž + montáž)	ks	4,000	Pol.99 - v rozpočtu jsou 4 kusy zábradlí na lodžii, ale ve skutečnosti jsou 2 kusy lodžiového zábradlí. Upozorňujeme, že repase zábradlí vyjde prakticky na ty samé peníze jako zábradlí nové (je tam demontáž, odvoz, vysklení, oboršení, nátěr, přesklení, lišty, nebo tmelení, dovoz, montáž, úprava rozměru).Doporučujeme, aby zadavatel změnil položku na dodávku a montáž nového zábradlí. V realizaci bude cena dvojnásobná než v tendru, tak to je. Doporučujeme rovnou hliníkové zábradlí, protože ocelové zábradlí je paradoxně dražší.
18.	Fasáda								V rozpočtu chybí položky úro uvedení terénu do původního stavu - uhrabání omítek a lepidel z trávy včetně likvidace, nákup a rozprostření ornice s rozhrnutím, vysetí trávníku.
19.	Fasáda								V rozpočtu chybí položky pro zábor veřejných prostranství pro relaizaci fasády a střechy.
20.	Fasáda								V rozpočtu chybí položky „Příplatek za příplatkový odstín finální omítky zateplovacího systému a barevného nátěru,, Tmavé a syté odstíny jsou výrazně příplatkové barvy - zejména, černá, červená atd.Prosím, uveďte plochy omítek a nátěrů v příplatkových barvách s uvedením příplatku.
21.	Fasáda								V projektu a v rozpočtu je navržená podlaha lodžie ve skladbě polystyren+folie+dlažba, tato skaldba nebude fungovat a budou s ní problémy. Dopročujeme změnit skladbu podlahy balkonu na klasickou systémovou skladbu - polysytyren ve spádu, separační pe folie, beton vyztužený sítí nebo vláknem, penetrace, sterkové hydroizolace včetně pásek, penetrace, lepidlo, dlažba, systémová plechová okapnice

Dotazy MŠ SRDÍČKO, PRAHA 12

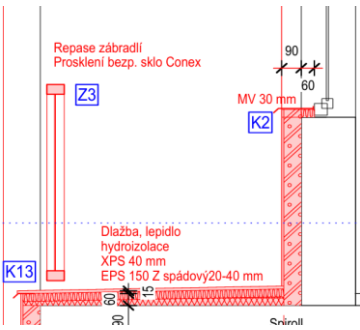číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci						Dotaz
22.	Fasáda		55	K	713113111	Nástřik stropu měkkou PUR pěnou v tl 100 mm koef 0,037 W/m/K včetně přípravy podkladu a zakrytí konstrukcí	m2	98,600	Pol.66 Nástřik stropu měkkou PUR pěnou v tl 100 mm koef 0,037 W/m/K včetně přípravy podkladu a zakrytí konstrukcí - kde bude použito této položky. Je toto řešení požárně vhodné?
23.	Střecha	1	1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,921	V rozpočtu a v projektu chybí ocelové trny pro spojení původní atiky s npvě nabetonovanou atikou. Tato konstrukce je zbytečná jelikož se nenavýšuje skladba střechy, naopak se skladba střechy sníží o 60 mm!!! Navíc se atika navýší již polystyrenem na koruně atiky a OSB deskou.
24.	Střecha								V projektu je v lodžích navržena vata TL.30 mm pod oplechováním parapetu - toto není vhodné, a mělo by to být nahrazeno polystyrenem XPS.
25.		43	43	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm,	m	258,900	Vně lodžie je navrženo pod klempířskými prvky položka č.43 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm. Pod oplechování parapetů spíše doporučujeme termomaltu anebo extrudovaný polystyren.
26.	Střecha								Pro krytinu z PVC folie chybí v rozpočtu tyto položky: poplastované lišty pro natavení PVC folie (koutové, rohové, stěnové, pásy), kotvy pro PVC folii, folie na detaily, zálivky atd. dle technologického předpisu. Navíc by v rozpočtu měli být položky pro kotvení folie v rozích a stranách u stěn a ve vnitřních polích střechy - zde je jiný počet kotev na m2.

číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci					Dotaz	
27.	Střecha		Řez stávající, Bourací práce Řez nový						
28.	Střecha	4	4	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm, pod věnec atiky	m	35,800	Pod železobetonový věnec se vyrovnávací vrstva nedělá a oplechování atiky bude na novém souřtvi koruny atiky. Navrhujeme položku zrušit.
29.	Střecha	5	5	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	823,000	Vyrovnávací cementový potěr v celé ploše střechy je zbytečný, nemá smysl. Je to zbytečná náklad v ceníkové ceně ÚRS to činí 305 333,-Kč bez DPH !!!! Po demontáži minerální vaty stačí stropní panely vyluxovat a napenetrovat asfaltovým lakem a následně již rovnou natavit parozábranu z asfaltových pásů. Navrhujeme tuto položku z rozpočtu odstranit a tuto konstrukci nerealizovat, tato konstrukce navíc není popsána v projektové dokumentaci!! Cementový potěr je mokřý proces při realizaci střechy, bude zdržovat a vznikne zatačení do objektu, jehož následky půjdou k tíži zadavateli pokud trvá na této položce.
30.	Střecha	Doplnění položky střecha_1	K1 oplechování					Prosíme doplnit do rozpočtu atikové klíny pro parotěsnou vrstvu z asfaltových pásů, aby se asfaltové pásy nelámaly v ostrém úhlu v koutu mezi stěnou atiky a stropním panelem.	
31.	Střecha	6	6	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3, atikového panelu	m3	2,909	V projektu není navrženo bourání atikových panelů střechy. Navrhujeme tuto položku z rozpočtu odstranit. Pokud zadavatel trvá na ponechání položky, tak prosíme o doplnění položek pro rozřezání panelů na menší kusy pro transport gedou anebo doplnění položky jeřábu.
32.	Střecha	Doplnění položky střecha_2						Prosíme o doplnění provedení jádrových vrtů do atiky střechy pro osazení bezpečnostních přepadů.	
33.	Střecha	7	7	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 9 m s omezením mechanizace	t	65,447	Prosíme, aby zadavatel snížil výměru o zrušené bourání atiky.


Dotazy MŠ SRDÍČKO, PRAHA 12

číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci						Dotaz
34.	Střecha	8	8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	65,447	Prosíme, aby zadavatel snížil výměru o zrušené bourání atiky.
35.	Střecha	9	9	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční - Příplatek za třídění a recyklaci sutí a vybouraných hmot	t	65,447	Prosíme, aby zadavatel snížil výměru o zrušené bourání atiky.
36.	Střecha	10	10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu nevyužitelného (30%)	t	19,634	Prosíme, aby zadavatel snížil výměru o zrušené bourání atiky.
37.	Střecha	11	11	K	997013871	Recyklace stavebního odpadu v minimální výši 70%stavebního odpadu dle Technických pokynů k uplatněná zásady "významě nepoškozovat" podľa nařízení a Nástroji pro oživení a odolnost - EK 2021/C 58/01) (uložení odpadu na recyklační skládce s jeho plným využitím) (70%)	t	45,813	Prosíme, aby zadavatel snížil výměru o zrušené bourání atiky.
38.	Střecha	Doplnění položky střecha_2							Prosíme o doplnění likvidace dřevěného odpadu z bourání dřevěné konstrukce dvouplášťové střechy.
39.	Střecha	Doplnění položky střecha_3							Prosíme o doplnění stavebního výtahu pro položky bourání střechy -doprava montáž, revize, demontáž, pronájem, vše včetně výstupu na střechu, rozvaděč, kabel.
40.	Střecha	Doplnění položky střecha_4							Prosíme o doplnění položky „Opatření proti zataecní do objektu při realizaci střechy,, - buď asfaltové pás anebo zaplachtování střechy.
41.	Střecha	Doplnění položky střecha_5							Prosíme o doplnění položky pro likvidaci odstraněné tepelné izolace ze skladby střešního pláště.
42.	Střecha	38	38	K	721211404	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou, - pojistný přepad, včetně montáže	kus	8,000	Prosíme o změnu množství bezpečnostních pojistných přepadů v rozpočtu na 11 kusů. V rozpočtu je pouze 8 kusů.

Revitalizace objektu MŠ Srdíčko v Praze 12. Leveského 3203/19,143.00 Praha 4 z.č.:822-18-03


DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY

Odvodnění střechy bude novými střešními vpustmi s integrovanou manžetou. Vpustě budou umístěny v místě stávajícího odvodnění. Vzhledem k nedostačenému počtu vpustí budou v konstrukci atiky provedeny pojistné **přepady**.



Revitalizace objektu MŠ Srdíčko v Praze 12, Levského 3203/19,143 00 Praha 4 z.č.:822-18-03
DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY

Odvodnění střechy bude novými střešními vpustmi s integrovanou manžetou. vpustě budou umístěny v místě stávajícího odvodnění. Vzhledem k nedostačenému počtu vpustí budou v konstrukci atiky provedeny pojistné přepady.



Dotazy MŠ SRDÍČKO, PRAHA 12

číslo dotazu	Část	Číslo položky	Popis položky, popis v projektové dokumentaci						Dotaz																																
43.	Střecha	30	29	K	713141321	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva	m2	823,000	Prosíme o úpravu položek tepelné izolace v rozpočtu podle projektové dokumnetace , anebo o změnu tepelné izolace v projektové dokumnetac, aby byl uvedený do souladu projekt a rozpočet. V projektu je navržená tepelná izolace střechy z polystyrenu EPS 100Z , ale v rozpočtu je tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 S. Podle nás je by pro zateplení střechy stačil polystyren EPS 100S, ten se běžně pro zateplení střech používá.																																
			30	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	82,300																																	
			<table><tr><td colspan="6">Střecha</td></tr><tr><td colspan="5">PVC folie</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td colspan="5">Geotextilie 300 g/m2</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Spádové klíny EPS 100 Z</td><td>20-160 mm</td></tr><tr><td colspan="5">EPS 100 Z</td><td>120 mm</td></tr><tr><td colspan="5">EPS 100 Z</td><td>100 mm</td></tr></table>							Střecha						PVC folie					1,5 mm	Geotextilie 300 g/m2						Spádové klíny EPS 100 Z					20-160 mm	EPS 100 Z					120 mm	EPS 100 Z	
Střecha																																									
PVC folie					1,5 mm																																				
Geotextilie 300 g/m2																																									
Spádové klíny EPS 100 Z					20-160 mm																																				
EPS 100 Z					120 mm																																				
EPS 100 Z					100 mm																																				
44.	Střecha	30	29	K	713141321	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva	m2	823,000	Prosíme o změnu množství výměry spádových klínů na 108,636 m3. V rozpočtu je malá výměra spádového polystyrenu střechy, správně by mělo být cca 108,636m3 (98,76m3 + prořez 10% 9,876m3. Průměrná délka spádování je cca 10 m, u vpusti je tl.spádového klínu 2cm EPS a u atiky 22 cm (10mb*2cm/m+2cm z kraje=22 cm), průměrná tloušťka je (22+2)/2=24/2=12 cm. 823m2*0,12=98,76m3 + 10% prořez = 108,636 m3.																																
			30	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	82,300																																	
45.	Střecha	45	45	K	V02	Demontáž a opětovná montáž zařízení slaboproudu na ploché střeše	kap	1,000	Prosíme přesnou specifikaci jaké zařízení slaboproudu na ploché střeše se bude demontovat a montovat zpátky, prosíme uveďte také množství a počty.																																
